


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

N п/п	Наименование работ	Кол-во рабочих в звене, чел.	Кол-во смен, шт.	Кол-во звеньев, шт.	Продол., дней	Количество недель																							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Подготовительные работы	10	1	1	14																								
2	Механ. работы по рытью котлована.	1	1	1	12																								
3	Земляные работы.	12	1	1	4																								
4	Уст-во монлитной ж.б. фун-ной плиты.	12	1	1	14																								
5	Монтаж фундаментных блоков	12	1	1	2																								
6	Монтаж фундаментных балок.	12	1	1	2																								
7	Монтаж армоопалубочных стеновых блок-ячеек	12	1	1	37																								
8	Уст-во ж.б. плиты перекрытия.	12	1	1	38																								
9	Монтаж колон	10	1	1	10																								
10	Монтаж ригелей	10	1	1	6																								
11	Монтаж подкрановых балок	10	1	1	6																								
12	Монтаж перегородок	10	1	1	6																								
13	Монтаж лестничных маршей площадок.	10	1	1	8																								
14	Монтаж ферм	10	1	1	8																								
15	Монтаж плит покрытия	10	1	1	8																								
16	Монтаж стеновых панелей	24	1	1	12																								
17	Устройство кровли	18	1	1	25																								
18	Отделочные работы.	12	1	1	45																								
19	Электромонтажные работы.	10	1	1	43																								
20	Устройство ввода коммуникаций	10	1	1	57																								
21	Монтаж технологич. оборудования.	12	1	1	16																								
22	Пусконаладочные работы.	12	1	1	16																								
23	Благоустройство территории.	14	1	1	14																								
24	Неучтенные работы.	8	1	1	18																								
25	Сдача объекта.	6	1	1	2																								

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ РАБОЧИХ

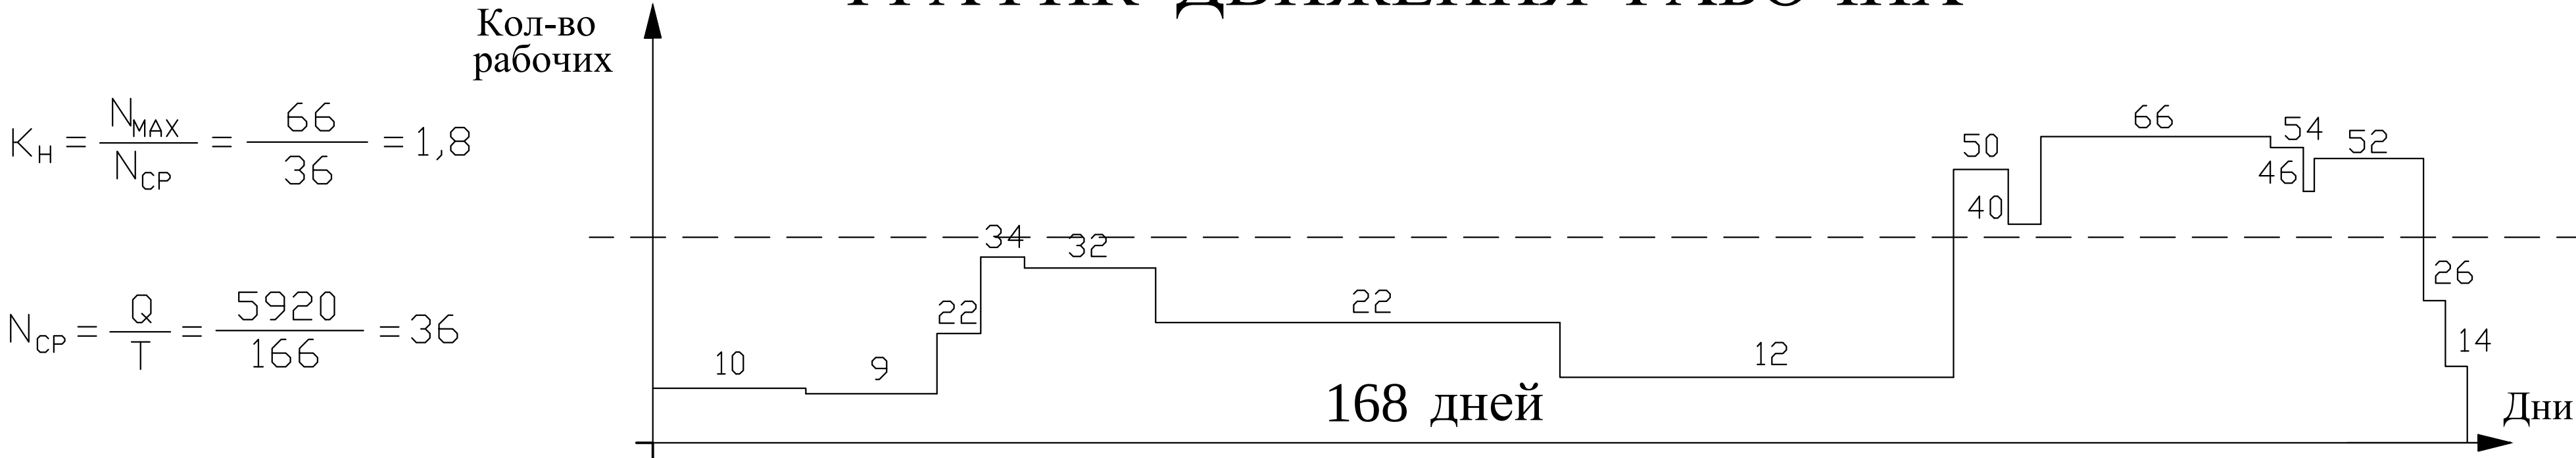

				НИУ МГСУ 08.03.01-ИАР-2017				
				Тема: здание хранилища радиоактивных отходов АЭС в Смоленской области				
	Ф.И.О.	Подпись	Дата					
Слушатель	Матроскин А.А.			Технология, организация и экономика строительства		стадия	лист	листов
Консультант	Славин А.М.					П	8	
Норм.контр.				Календарный план		ЭДИЛСК ДПО ИСА 2ДПГС-Н-17-001		
Рук. ИАР	Славин А.М.							
Нач. ДПО	Федосыина А.В.							
